



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

Diamante do Norte/PR, 28 de abril de 2026.

MEMORANDO INTERNO

De: Departamento de Engenharia

Para: Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Memorando 327/2026 – Ofício 24/2026 enviado pela Câmara Municipal

Processo Licitatório: Concorrência nº 03/2024

Contrato Administrativo: nº 39/2024

Em resposta ao Memorando Interno 327/2026, no qual foi encaminhado o Ofício nº 24/2026, enviado pela Câmara Municipal, acerca da Reforma do Ginásio de Esportes Prefeito Manoel F. de Queiróz, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos:

- Informo que a obra de reforma do Ginásio de Esportes, objeto do Processo Licitatório – Concorrência nº 03/2024, e formalizada por meio do Contrato Administrativo nº 39/2024, encontra-se com **100%** (cem por cento) de execução física concluída;

- Todos os serviços foram executados. A última medição dos serviços foi realizada em 26 de fevereiro de 2026, correspondente à etapa final de execução;

- A empresa contratada para a execução dos serviços foi Martins Lima Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.822.153/0001-08, com sede no município de Itaúna do Sul/PR;

- Com relação à execução financeira, informo que o valor total pago pela Administração, relativo à execução do objeto contratual foi de R\$ 1.154.764,90 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos);

- Para fins de comprovação, serão anexados a este memorando o relatório fotográfico, as medições realizadas e contrato nº 39/2024, onde consta todos os trâmites contratuais realizados após a assinatura do contrato.

Por fim, certifica-se a conclusão do objeto contratual (Contrato nº 39/2024).



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

O município está executando outros serviços no ginásio de esportes, como a colocação de piso modular na quadra, e instalação do sistema de iluminação e aterramento. No entanto, esses serviços não estão incluídos no projeto inicial de reforma do ginásio de esportes, e estão em processos licitatórios e contratos separados, com outras empresas sendo responsáveis pela execução.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Michel Borghi Ferraz Rodrigues

Engenheiro Civil



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE


ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

ANEXO – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 01

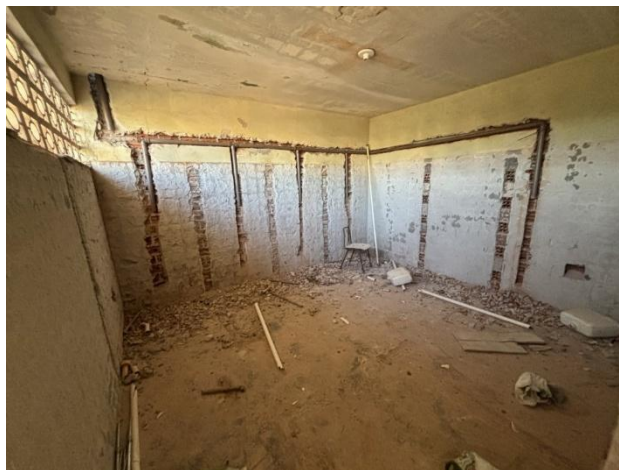



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 02





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 03





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 04





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 05





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 06





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 07







MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 08

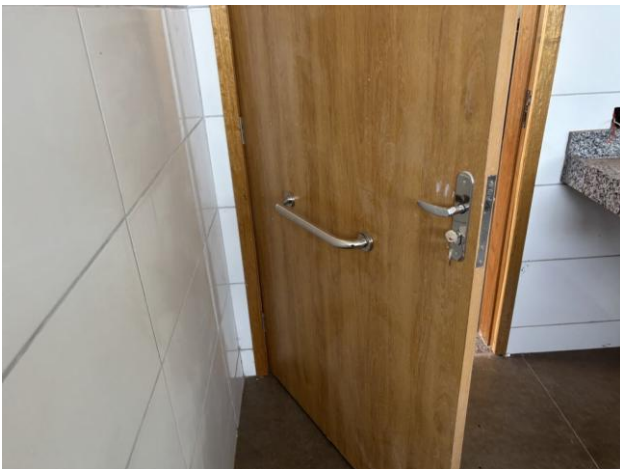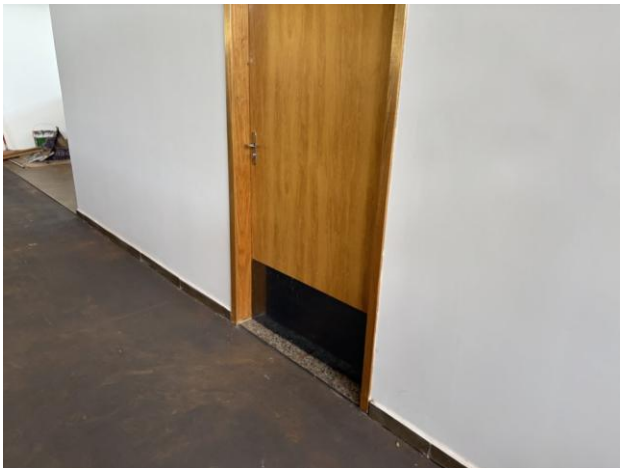




MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 01 – INDENIZAÇÃO

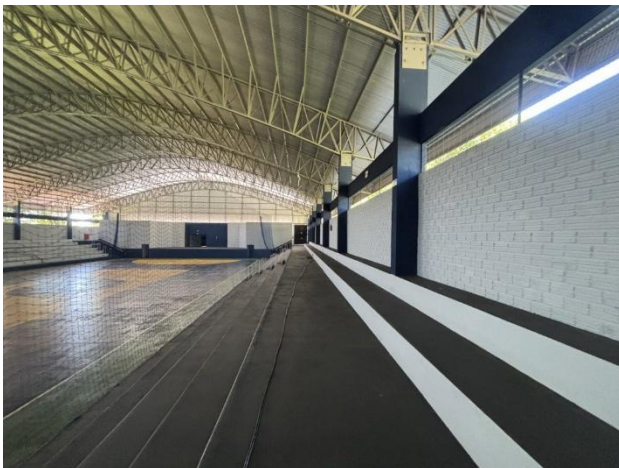




MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

MEDIÇÃO 09

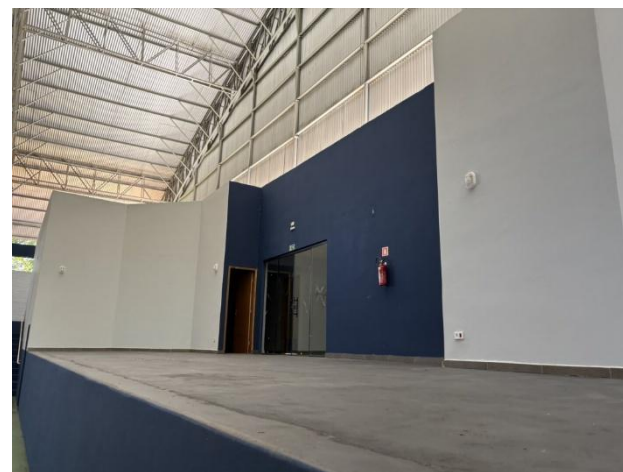




MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

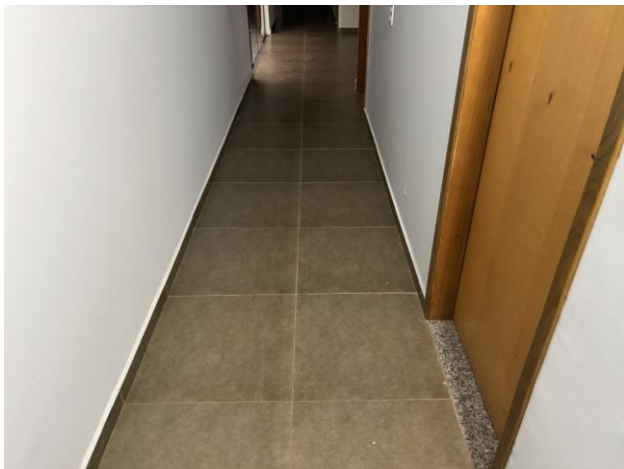



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: D. MARTINS DE LIMA - ME

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 01
DATA MEDIÇÃO: 03/07/2024
VALOR CONTRATO: R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55	77,13%	R\$ 1.110,27	77,13%	R\$ 1.110,27
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83	83,31%	R\$ 6.190,76	83,31%	R\$ 6.190,76
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14	43,23%	R\$ 26.449,62	43,23%	R\$ 26.449,62
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24		R\$ 30.291,55		
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33		R\$ 11.249,14		
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79		R\$ 8.011,79		
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92				
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68				
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93				
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23				
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30				
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96				
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65				
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51		R\$ 13.157,44		
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05				
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78				
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90				
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05				
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00				
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87				
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91				
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38				
TOTAL:			R\$ 934.300,00	10,32%	R\$ 96.460,57	3,61%	R\$ 33.750,65

Totaliza a presente medição o valor de: **R\$ 96.460,57**

Diamante do Norte/PR
Data: 03/07/2024

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ

DATA DA O.S.: 10/05/2024

LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 02

CONTRATO: 39/2024

DATA MEDIÇÃO: 14/08/2024

EMPRESA: D. MARTINS DE LIMA - ME

VALOR CONTRATO: R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			77,13%	R\$ 1.110,27
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83	4,17%	R\$ 310,02	87,48%	R\$ 6.500,78
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			43,23%	R\$ 26.449,62
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24	48,35%	R\$ 28.358,69	100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33	35,13%	R\$ 11.040,71	70,93%	R\$ 22.289,85
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92			0,00%	R\$ 0,00
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68			0,00%	R\$ 0,00
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93	5,75%	R\$ 5.423,36	5,75%	R\$ 5.423,36
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			0,00%	R\$ 0,00
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			0,00%	R\$ 0,00
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96			0,00%	R\$ 0,00
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			0,00%	R\$ 0,00
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51	18,71%	R\$ 11.932,76	39,34%	R\$ 25.090,20
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05			0,00%	R\$ 0,00
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78			0,00%	R\$ 0,00
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90			0,00%	R\$ 0,00
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			0,00%	R\$ 0,00
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			0,00%	R\$ 0,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			0,00%	R\$ 0,00
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			0,00%	R\$ 0,00
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00
TOTAL:			R\$ 934.300,00	6,11%	R\$ 57.065,54	16,43%	R\$ 153.526,11

Totaliza a presente medição o valor de : **R\$ 57.065,54**

Diamante do Norte/PR

Data: 14/08/2024

MICHEL BORGHY FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL.

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: D. MARTINS DE LIMA - ME

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 03
DATA MEDIÇÃO: 08/11/2024
VALOR CONTRATO: R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			77,13%	R\$ 1.110,27
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83			87,48%	R\$ 6.500,78
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			43,23%	R\$ 26.449,62
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33	29,07%	R\$ 9.134,48	100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92	20,83%	R\$ 3.683,69	20,83%	R\$ 3.683,69
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68	15,06%	R\$ 17.767,92	15,06%	R\$ 17.767,92
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93			5,75%	R\$ 5.423,36
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23	100,00%	R\$ 50.585,23	100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			0,00%	R\$ 0,00
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96			0,00%	R\$ 0,00
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65	100,00%	R\$ 48.197,65	100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51	1,93%	R\$ 1.231,32	41,26%	R\$ 26.321,52
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05			0,00%	R\$ 0,00
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78			0,00%	R\$ 0,00
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90			0,00%	R\$ 0,00
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			0,00%	R\$ 0,00
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			0,00%	R\$ 0,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			0,00%	R\$ 0,00
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			0,00%	R\$ 0,00
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 13,98% R\$ 130.600,29 30,41% R\$ 284.126,40

Totaliza a presente medição o valor de : R\$ 130.600,29

Diamante do Norte/PR

Data: 08/11/2024

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: **REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ**

LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES

CONTRATO: 39/2024

EMPRESA: D. MARTINS DE LIMA - ME

DATA DA O.S.: 10/05/2024

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 04

DATA MEDIÇÃO: 13/01/2025

VALOR CONTRATO: **R\$ 934.300,00**

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55	22,87%	R\$ 329,28	100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83	10,43%	R\$ 775,05	97,91%	R\$ 7.275,83
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14	56,77%	R\$ 34.730,52	100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92	65,71%	R\$ 11.621,14	86,54%	R\$ 15.304,83
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68			15,06%	R\$ 17.767,92
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93			5,75%	R\$ 5.423,36
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			0,00%	R\$ 0,00
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96	8,50%	R\$ 1.200,83	8,50%	R\$ 1.200,83
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51	44,61%	R\$ 28.454,71	85,88%	R\$ 54.776,23
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05	40,16%	R\$ 19.549,30	40,16%	R\$ 19.549,30
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78	37,60%	R\$ 23.337,00	37,60%	R\$ 23.337,00
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90	12,21%	R\$ 11.366,79	12,21%	R\$ 11.366,79
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			0,00%	R\$ 0,00
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			0,00%	R\$ 0,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			0,00%	R\$ 0,00
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			0,00%	R\$ 0,00
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 14,06% R\$ 131.364,62 44,47% R\$ 415.491,02

Totaliza a presente medição o valor de : **R\$ 131.364,62**

Diamante do Norte/PR

Data: 13/01/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: D. MARTINS DE LIMA - ME

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO N°: 05
DATA MEDIÇÃO: 21/05/2025
VALOR CONTRATO: R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83	2,09%	R\$ 155,00	100,00%	R\$ 7.430,83
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92	8,13%	R\$ 1.438,11	94,67%	R\$ 16.742,94
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68	63,28%	R\$ 74.670,52	78,34%	R\$ 92.438,44
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93			5,75%	R\$ 5.423,36
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			0,00%	R\$ 0,00
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96	58,35%	R\$ 8.245,35	66,85%	R\$ 9.446,18
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51			85,87%	R\$ 54.776,23
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05			40,16%	R\$ 19.549,30
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78			37,60%	R\$ 23.337,00
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90			12,21%	R\$ 11.366,79
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			0,00%	R\$ 0,00
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			0,00%	R\$ 0,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			0,00%	R\$ 0,00
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			0,00%	R\$ 0,00
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 9,05% R\$ 84.508,98 53,52% R\$ 500.000,00

Totaliza a presente medição o valor de : R\$ 84.508,98

Diamante do Norte/PR

Data: 21/05/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ
LOCALIZAÇÃO:	RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO:	39/2024
EMPRESA:	MARTINS LIMA LTDA

DATA DA O.S.:	10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº:	06
DATA MEDIÇÃO:	17/06/2025
VALOR CONTRATO:	R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83			100,00%	R\$ 7.430,83
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92	5,33%	R\$ 942,98	100,00%	R\$ 17.685,92
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68	17,57%	R\$ 20.733,56	95,91%	R\$ 113.172,00
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93	71,96%	R\$ 67.916,64	77,71%	R\$ 73.340,00
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			0,00%	R\$ 0,00
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96			66,85%	R\$ 9.446,18
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51			85,87%	R\$ 54.776,23
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05	32,98%	R\$ 16.054,04	73,14%	R\$ 35.603,34
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78	49,25%	R\$ 30.571,86	86,85%	R\$ 53.908,86
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90	4,06%	R\$ 3.780,92	16,27%	R\$ 15.147,71
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			0,00%	R\$ 0,00
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			0,00%	R\$ 0,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			0,00%	R\$ 0,00
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			0,00%	R\$ 0,00
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 14,98% R\$ 140.000,00 68,50% R\$ 640.000,00

Totaliza a presente medição o valor de : R\$ 140.000,00

Diamante do Norte/PR

Data: 17/06/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ
RODRIGUES:0526715197
1
Assinado de forma digital
por MICHEL BORGHI
FERRAZ
RODRIGUES:05267151971

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS
CORREA:03078856
909
Assinado de forma
digital por ELIEL DOS
SANTOS
CORREA:03078856909

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: MARTINS LIMA LTDA

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 07
DATA MEDIÇÃO: 19/09/2025
VALOR CONTRATO: R\$ 934.300,00

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83			100,00%	R\$ 7.430,83
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92			100,00%	R\$ 17.685,92
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68	2,51%	R\$ 2.965,36	98,42%	R\$ 116.137,36
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93	12,26%	R\$ 11.567,36	89,97%	R\$ 84.907,36
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30	9,48%	R\$ 8.987,38	9,48%	R\$ 8.987,38
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96	33,15%	R\$ 4.684,78	100,00%	R\$ 14.130,96
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51	-4,88%	-R\$ 3.113,77	80,99%	R\$ 51.662,46
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05	24,23%	R\$ 11.793,83	97,37%	R\$ 47.397,17
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78	13,15%	R\$ 8.159,92	100,00%	R\$ 62.068,78
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90	83,73%	R\$ 77.945,19	100,00%	R\$ 93.092,90
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05	65,56%	R\$ 25.938,50	65,56%	R\$ 25.938,50
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00	100,00%	R\$ 457,00	100,00%	R\$ 457,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87	100,00%	R\$ 12.877,87	100,00%	R\$ 12.877,87
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91	100,00%	R\$ 4.807,91	100,00%	R\$ 4.807,91
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 17,88% R\$ 167.071,33 86,38% R\$ 807.071,33

Totaliza a presente medição o valor de : **R\$ 167.071,33**

Diamante do Norte/PR

Data: 19/09/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: **REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIRÓZ**
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: MARTINS LIMA LTDA

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 08
DATA MEDIÇÃO: 15/12/2025
VALOR CONTRATO: **R\$ 934.300,00**

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,15%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,80%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83			100,00%	R\$ 7.430,83
3	6,55%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,28%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,36%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,86%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	1,89%	JANELAS	R\$ 17.685,92			100,00%	R\$ 17.685,92
8	12,63%	PORTAS	R\$ 117.996,68	1,58%	R\$ 1.859,32	100,00%	R\$ 117.996,68
9	10,10%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93	2,02%	R\$ 1.904,01	91,99%	R\$ 86.811,37
10	5,41%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	10,14%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 94.777,30			9,48%	R\$ 8.987,38
12	1,51%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96			100,00%	R\$ 14.130,96
13	5,16%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	6,83%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 63.786,51	5,59%	R\$ 3.563,90	86,58%	R\$ 55.226,36
15	5,21%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 48.681,05			97,36%	R\$ 47.397,17
16	6,64%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 62.068,78	-1,81%	-R\$ 1.124,58	98,19%	R\$ 60.944,20
17	9,96%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90			100,00%	R\$ 93.092,90
18	4,23%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05	34,44%	R\$ 13.625,55	100,00%	R\$ 39.564,05
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			100,00%	R\$ 457,00
20	1,38%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			100,00%	R\$ 12.877,87
21	0,51%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			100,00%	R\$ 4.807,91
22	0,33%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 934.300,00 2,12% R\$ 19.828,20 88,50% R\$ 826.899,53

Totaliza a presente medição o valor de: **R\$ 19.828,20**

Diamante do Norte/PR

Data: 15/12/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024
EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIROZ - INDENIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES
CONTRATO: 39/2024
EMPRESA: MARTINS LIMA LTDA

DATA DA O.S.: 10/05/2024
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº: 01 - INDENIZAÇÃO
DATA MEDIÇÃO: 30/12/2025
VALOR: R\$ 275.487,52

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,08%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 211,52	100,00%	R\$ 211,52	100,00%	R\$ 211,52
2	0,56%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 1.555,61	100,00%	R\$ 1.555,61	100,00%	R\$ 1.555,61
3	3,01%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 8.294,76	100,00%	R\$ 8.294,76	100,00%	R\$ 8.294,76
4	3,46%	COBERTURA METÁLICA	R\$ 9.520,44	100,00%	R\$ 9.520,44	100,00%	R\$ 9.520,44
5	4,48%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 12.339,21	100,00%	R\$ 12.339,21	100,00%	R\$ 12.339,21
6	9,87%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 27.200,34	100,00%	R\$ 27.200,34	100,00%	R\$ 27.200,34
7	6,80%	JANELAS	R\$ 18.743,80	100,00%	R\$ 18.743,80	100,00%	R\$ 18.743,80
8	0,79%	PORTAS	R\$ 2.182,44	100,00%	R\$ 2.182,44	100,00%	R\$ 2.182,44
9	2,32%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 6.384,80	100,00%	R\$ 6.384,80	100,00%	R\$ 6.384,80
10	0,78%	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO	R\$ 2.140,15	100,00%	R\$ 2.140,15	100,00%	R\$ 2.140,15
11	16,21%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 44.668,22	100,00%	R\$ 44.668,22	100,00%	R\$ 44.668,22
12	6,12%	CALÇAMENTO EM CONCRETO	R\$ 16.858,29	100,00%	R\$ 16.858,29	100,00%	R\$ 16.858,29
14	16,05%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.212,23	100,00%	R\$ 44.212,23	100,00%	R\$ 44.212,23
15	1,10%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 3.043,51	100,00%	R\$ 3.043,51	100,00%	R\$ 3.043,51
16	11,60%	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 31.961,23	100,00%	R\$ 31.961,23	100,00%	R\$ 31.961,23
17	2,47%	PINTURA INTERNA	R\$ 6.814,13	100,00%	R\$ 6.814,13	100,00%	R\$ 6.814,13
21	1,25%	PAISAGISMO	R\$ 3.449,92	100,00%	R\$ 3.449,92	100,00%	R\$ 3.449,92
23	9,04%	ELÉTRICA	R\$ 24.898,67	100,00%	R\$ 24.898,67	100,00%	R\$ 24.898,67
24	4,00%	ESTRUTURAS DIVERSAS	R\$ 11.008,20	100,00%	R\$ 11.008,20	100,00%	R\$ 11.008,20

TOTAL: R\$ 275.487,52 100,00% R\$ 275.487,52 100,00% R\$ 275.487,52

Totaliza a presente medição o valor de : **R\$ 275.487,52**

Diamante do Norte/PR
Data: 30/12/2025

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS CORREA
CPF: 030.788.569-09
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

PLANILHA DE MEDIÇÃO



OBRA: **REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PREFEITO MANOEL F. DE QUEIROZ**

LOCALIZAÇÃO: RUA RUBENS FERNANDES GOMES

CONTRATO: **39/2024**

EMPRESA: MARTINS LIMA LTDA

DATA DA O.S.: 10/05/2024

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO N°: **09**

DATA MEDIÇÃO: 26/02/2026

VALOR CONTRATO: **R\$ 841.281,83**

ITEM	PESO (%)	DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO (R\$)	% MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	ACUMULADO (%)	ACUMULADO (R\$)
1	0,17%	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.439,55			100,00%	R\$ 1.439,55
2	0,88%	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 7.430,83			100,00%	R\$ 7.430,83
3	7,27%	PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 61.180,14			100,00%	R\$ 61.180,14
4	6,97%	COBERTURA METALICA	R\$ 58.650,24			100,00%	R\$ 58.650,24
5	3,74%	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 31.424,33			100,00%	R\$ 31.424,33
6	0,95%	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.011,79			100,00%	R\$ 8.011,79
7	2,10%	JANELAS	R\$ 17.685,92			100,00%	R\$ 17.685,92
8	14,03%	PORTAS	R\$ 117.996,68			100,00%	R\$ 117.996,68
9	11,22%	RAMPA E ACESSIBILIDADE	R\$ 94.377,93	8,02%	R\$ 7.566,56	100,00%	R\$ 94.377,93
10	6,01%	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO	R\$ 50.585,23			100,00%	R\$ 50.585,23
11	1,07%	PISO INTERNO EM CONCRETO	R\$ 8.987,38			100,00%	R\$ 8.987,38
12	1,68%	CALÇAMENTO E CONCRETO	R\$ 14.130,96			100,00%	R\$ 14.130,96
13	5,73%	INSTALAÇÕES PARA RESERVATÓRIO	R\$ 48.197,65			100,00%	R\$ 48.197,65
14	7,01%	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 58.966,72	6,34%	R\$ 3.740,36	100,00%	R\$ 58.966,72
15	5,63%	LOUÇAS SANITÁRIAS	R\$ 47.397,17			100,00%	R\$ 47.397,17
16	7,24%	SISTEMA PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 60.944,20			100,00%	R\$ 60.944,20
17	11,07%	PINTURA INTERNA	R\$ 93.092,90			100,00%	R\$ 93.092,90
18	4,70%	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.564,05			100,00%	R\$ 39.564,05
19	0,05%	PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA	R\$ 457,00			100,00%	R\$ 457,00
20	1,53%	PINTURA DE LAJE	R\$ 12.877,87			100,00%	R\$ 12.877,87
21	0,57%	PAISAGISMO	R\$ 4.807,91			100,00%	R\$ 4.807,91
22	0,37%	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.075,38	100,00%	R\$ 3.075,38	100,00%	R\$ 3.075,38

TOTAL: R\$ 841.281,83 1,71% R\$ 14.382,30 100,00% R\$ 841.281,83

Totaliza a presente medição o valor de : **R\$ 14.382,30**

Diamante do Norte/PR

Data: 26/02/2026

MICHEL BORGHI
FERRAZ
RODRIGUES:052671519
71

Assinado de forma digital
por MICHEL BORGHI
FERRAZ
RODRIGUES:05267151971

MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES
Engenheiro Civil | CREA-PR 122886/D

ELIEL DOS SANTOS
CORREA:03078856
909

Assinado de forma
digital por ELIEL DOS
SANTOS
CORREA:03078856909

ELIEL DOS SANTOS CORREA
Prefeito Municipal

OBSERVAÇÃO:

CONCORRÊNCIA 03/2024

EMENDA ESPECIAL 2023 - SENADOR ALVARO DIAS

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

HOUE UMA SUPRESSÃO NO CONTRATO (5º TERMO ADITIVO) NO VALOR DE R\$ 93.018,17, PASSANDO O VALOR DE R\$ 934.300,00 PARA R\$ 841.281,83.
